

## Social og sundhedsområdet

## Fælles Sprog III implementeringsstøtte

**Dato:** 11. juni 2018**Projektleder:** Kirsten Krag Olofson/Dorthe Skou Lassen**Formål:**

FSIII er en kommunal standard for sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation, som samtlige kommuner skal implementere inden d. 30.06.2018. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale socialfaglige og sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren.

Kommunerne er opdelt i tre implementeringsbølger, med planlagt implementering senest 30. juni 2018. KL varetager alt omkring indhold, uddannelse i og anvendelsen af FSIII, og har nedsat styregruppe og programledelse. MedCom skal understøtte implementeringsprocessen, samt sikre fremdrift i forberedelse og implementering af FSIII i alle kommuner. Samarbejdet med EOJ-leverandørerne er forankret i kommunerne.

**Organisatorisk forberedelse og teknisk implementering****Deltagere:**

Samtlige kommuner, KL, MedCom

**Leverandører:**

Samtlige kommuner, KL, MedCom

**Læs mere om projektet:** MedCom <https://www.medcom.dk/projekter/faelles-sprog-iii> KL <http://fs3.nu/>**Test og certificering XML FSIII Udvekslingsdatasæt****Deltagere/leverandører:**

pilotkommuner, MedCom, EOJ-leverandørerne Systematik, KMD, DXC

**Læs mere:** <http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20Sygehus-Kommunesamarbejde/FS3UDV/>**Projektstatus**

46 kommuner er organisatorisk implementerede, mens 5 kommuner på nuværende tidspunkt først forventer at implementere i 2019. Alle parter er udfordrede af, at hele 48 kommuner er/har været i udbud; 6 kommuner har endnu ikke indgået aftale med en EOJ-leverandør om et FSIII-kompatibelt EOJ-system.

Der har netop været afholdt de sidste planlagte netværksmøder for kommunerne. Her var fokus, hvordan kommunerne sikrer fortsat korrekt anvendelse af FSIII-metoden, og vedligeholder ift. metodiske opdateringer. Der var stadig entusiasme omkring FSIII, men også bekymring over, at den planlagte implementeringsunderstøttelse fra MedCom ophører med udgangen af juni 2018. FSIII-styregruppen har derfor besluttet, at KL kan afholde opfølgende netværksmøder for kommunerne (2 møder/år i hhv. Øst- og Vestdanmark). Der er fortsat tæt sparring mellem KL og MedCom. Sidste planlagt møde i KL's og MedComs fælles FSIII-implementeringsteam afholdes i juni måned.

**Strategisk lige nu**

Præ-governancegruppen, hvor MedCom deltager, arbejder med at opdatere metoden og alle tilknyttede materialer, på baggrund af kommunernes erfaringer indtil nu. Dette arbejde var planlagt afsluttet inden udgangen af juni, men er af ressourcemæssige årsager blevet forlænget, og med forventet udsendelse af opdaterede materialer slut Q3/start Q4 2018.

**Fagligt/teknisk lige nu**

FSIII UDV XML blev releaseet til EOJ-leverandørerne nov. 2017, med mål om MedCom test og certificering senest 30.6 2018, på nuværende tidspunkt har Odense Kommune anmodet en dato for at blive testet. Der er desuden aftalt pilotafprøvning/End2End Test. Der er opmærksomhed på sammenhæng i uddata til indberetning til Danmarks Statistik og Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). KL's kompatibilitetsvurdering foretages uafhængigt af MedCom-certificering af FSIII udvekslingsdatasættet. EOJ-leverandørerne skulle alle have været kompatibilitetsvurderet i løbet af 2017, Systematik endnu ikke anmodet om en dato. MedCom deltager i KL's tekniske gruppe for EOJ-leverandørerne.

**Risikolog**

Adskillige kommuner (48) har været/er i udbud i løbet af projektperioden. Velfungerende EOJ-løsninger med FSIII er afgørende for succesfuld implementering i praksis. Endelig status for EOJ-funktionalitet kendes tidligst medio 2018, når alle EOJ-løsninger er i drift. Columna Cura er endnu ikke kompatibilitetsvurderet. Projektet er omfattende og der er få nøglepersoner til at udarbejde materialer og værktøjer, som skal være til rådighed for kommunerne.

**Milepæle**

	<b>Plan</b>	<b>Nået</b>
1. Konsolidering af samarbejde mellem KL og MedCom, ligeledes piloterne	01.07.16	01.07.16
2. Afholdelse af opstartworkshops for bølge 1 + 2 + 3 kommuner	11.01.17	26.01.17
3. Slutrapportering på pilottest og opstartserfaringer	30.04.17	05.06.17
4. Afholdt afsluttende netværksmøder for alle 3 bølger	07.05.18	07.05.18
5. Samtlige kommuner i drift med FSIII	30.06.18	

# Monitorering

## Fælles Sprog III monitorering af implementering

De 98 kommuner implementeres i 3 bølger

- Bølge 1 omfatter 16 kommuner
- Bølge 2 omfatter 23 kommuner
- Bølge 3 omfatter 59 kommuner


OBS – opdatering sker efter bølgemøderne, hver bølge har derfor sin egen tidskaldance.

Kommunerne indrapporterer på følgende parametre i forbindelse med MedComs netværksmøder:

FSIII monitoreringsparametre implementering		Antal kommuner per parameter	% af alle kommuner
		Status d. 4. maj 2018	
<b>Monitorering i 3 trin</b>	<b>Parametre</b>		
1. Organisatorisk implementering	1. Er der valgt projektleder	98	100%
	2. Er der nedsat styregruppe	98	100%
	3. Har kommunens instruktører været på instruktørkursus	98	100%
	4. Undervisning gennemført i alle organisatoriske enheder	46	47%
2. Teknisk implementering	1. Har man indgået aftale med leverandør med dato for snitflade implementering	92	94%
	2. Har man implementeret/opgraderet til en FSIII version	51	52%
3. Overgang til drift	1. FSIII overdraget til drift	29	30%
	2. Taget FSIII i brug i alle organisatoriske enheder	18	18%


Danmarkskort – udarbejdes for monitoreringstrin på niveau 1-3

### Organisatorisk implementering

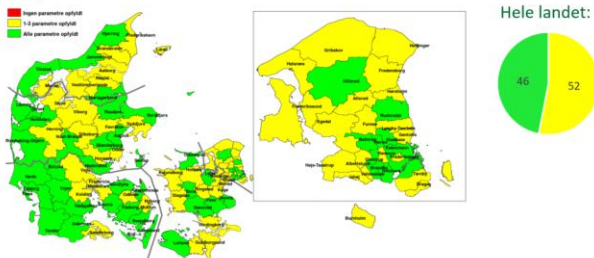


Status per 04-05-18  
Parametre: 1) Valgt projektleder, 2) Nedsat styregruppe, 3) Gennemgået instruktørkursus 4) Gennemført uddannelse i alle organisatoriske enheder

### Teknisk implementering

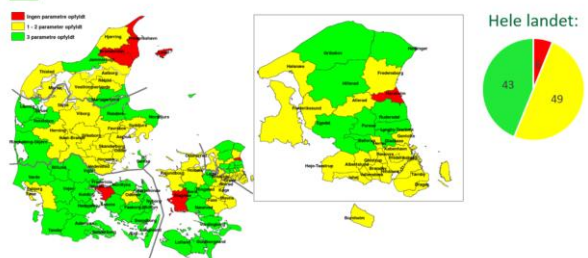

Status per 04-05-18  
Rød: Ingen aftale, Gul: Har aftale om opgradering eller har opgraderet til ikke godkendt FSIII-version, Grøn: Opgraderet til FSIII-kompatibel version

### Overgang til drift

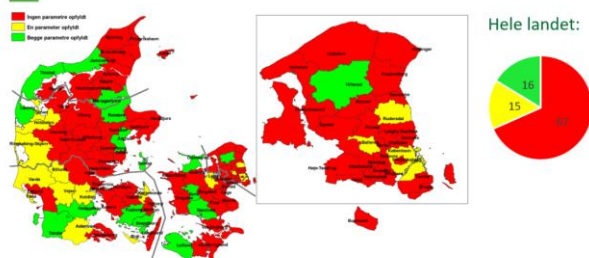

Status per 04-05-18  
Parametre: 1) Ibrugtagning i alle organisatoriske enheder 2) Nedlagt som projekt og overdraget til drift
